

Comune di Norbello
Provincia di Oristano

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA
 PUBBLICA LUNGO VIA AZUNI

COMMITTENTE:

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta Oneri della sicurezza Somme a disposizione dell'amministrazione Costo complessivo dell'opera	

Norbello, li

Il Progettista:

ID	Nome	Durata: 64,00 g - (2g)	Inizio	Fine	31 ott 11	07 nov 11	14 nov 11	21 nov 11	28 nov 11	05 dic 11	12 dic 11	19 dic 11	26 dic 11	02 gen
					m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
1	d04 - Rimozione completa di cordonate	2g	mer 02/11/11	gio 03/11/11										
2	d01 - Demolizione completa di	2g	ven 04/11/11	lun 07/11/11										
3	d02 - SCAVO A LARGA SEZIONE	2g	mar 08/11/11	mer 09/11/11										
4	d03 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	2g	gio 10/11/11	ven 11/11/11										
5	d05 - DEMOLIZIONE DI	2g	lun 14/11/11	mar 15/11/11										
6	d06 - TRASPORTO DEI MATERIALI DI	3g	mer 16/11/11	ven 18/11/11										
7	d07 - INDENNITA' DI CONFERIMENTO A	3g	lun 21/11/11	mer 23/11/11										
8	e02 - Strato di fondazione da eseguire	2g	gio 24/11/11	ven 25/11/11										
9	e01 - FORMAZIONE DI RILEVATO	3g	lun 28/11/11	mer 30/11/11										
10	e03 - MASSETTO STRADALE	2g	gio 01/12/11	ven 02/12/11										
11	e12 - PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI	3g	lun 05/12/11	mer 07/12/11										
12	e13 - CORDONATA STRADALE IN	2g	gio 08/12/11	ven 09/12/11										
13	e18 - Fornitura e posa in opera di cordolo	2g	lun 12/12/11	mar 13/12/11										
14	e20 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	3g	mer 14/12/11	ven 16/12/11										
15	e21 - LASTRICATO PER ESTERNI	2g	lun 19/12/11	mar 20/12/11										
16	e24 - RIMOZIONE E	2g	mer 21/12/11	gio 22/12/11										
17	e25 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI	1g	ven 23/12/11	ven 23/12/11										
18	f01 - CALCESTRUZZO PER OPERE	2g	lun 26/12/11	mar 27/12/11										
19	f03 - Calcestruzzo a durabilita' garantita	2g	mer 28/12/11	gio 29/12/11										
20	f06 - ACCIAIO PER ARMATURA DI	2g	ven 30/12/11	lun 02/01/12										
21	f07 - CASSEFORME in legname o	2g	mar 03/01/12	mer 04/01/12										
22	f09 - Realizzazione di muratura per	2g	gio 05/01/12	ven 06/01/12										
23	f14 - Fornitura e posa in opera di	2g	lun 09/01/12	mar 10/01/12										
24	f50 - Realizzazione di siepi in essenze	2g	mer 11/01/12	gio 12/01/12										
25	h10 - Fornitura e posa in opera di	2g	ven 13/01/12	lun 16/01/12										
26	h13 - Fornitura e posa in opera di cavo	2g	mar 17/01/12	mer 18/01/12										
27	h21 - Fornitura e posa in opera di giunto	2g	gio 19/01/12	ven 20/01/12										
28	f55 - Fornitura e stesa di terra vegetale	2g	lun 23/01/12	mar 24/01/12										
29	h18 - Fornitura e posa in opera di	1g	mer 25/01/12	mer 25/01/12										
30	h28 - Fornitura e posa in opera di	1g	gio 26/01/12	gio 26/01/12										
31	h29 - Fornitura e posa in opera di palo	1g	ven 27/01/12	ven 27/01/12										
32	h30 - Fornitura e posa in opera di lanterna	1g	lun 30/01/12	lun 30/01/12										
33	sic - Oneri per la sicurezza	64g	mer 02/11/11	lun 30/01/12										

Comune di Norbello
Provincia di Oristano

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA
 PUBBLICA LUNGO VIA AZUNI

COMMITTENTE:

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	
Oneri della sicurezza	
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Costo complessivo dell'opera	

Norbello, li

Il Progettista:

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 02/11/2011 a 09/12/2011	da 10/12/2011 a 30/01/2012				
d04 - Rimozione completa di cordonate stradali in cv /cls o copertine di muretti	€ 955,20	€ 955,20					
d01 - Demolizione completa di pavimentazione esterna in massetto continuo di calcestruzzo non armato	€ 2.512,19	€ 2.512,19					
d02 - SCAVO A LARGA SEZIONE eseguito con mezzi meccanici e a mano, in strade urbane,	€ 1.452,20	€ 1.452,20					
d03 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici e a mano, in strade urbane	€ 407,31	€ 407,31					
d05 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE o marciapiedi in conglomerato bituminoso o cementizio,	€ 32,80	€ 32,80					
d06 - TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA, as...o; escluso l'indennità di conferimento.	€ 669,44	€ 669,44					
d07 - INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA...tivamente conferito, escluso trasposto.	€ 1.129,13	€ 1.129,13					
e02 - Strato di fondazione da eseguire con misto granulometrico arido di cava	€ 979,77	€ 979,77					
e01 - FORMAZIONE DI RILEVATO	€ 1.218,28	€ 1.218,28					
e03 - MASSETTO STRADALE ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO, RCK 25	€ 4.436,50	€ 4.436,50					
e12 - PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRONI QUADRATI DI PIETRA BASALTICA	€ 6.702,16	€ 6.702,16					
e13 - CORDONATA STRADALE IN PIETRA BASALTICA	€ 5.327,61	€ 5.327,61					
e18 - Fornitura e posa in opera di cordolo d...econdo ulteriori indicazioni della D.L.	€ 798,86		€ 798,86				
e20 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA IN LASTRE BASALTICHE secondo schema	€ 822,20		€ 822,20				
e21 - LASTRICATO PER ESTERNI PEDONABILE, in pietrame basaltico segato e anticato	€ 7.884,93		€ 7.884,93				
A Riportare:		€ 25.822,59	€ 9.505,99				

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 02/11/2011 a 09/12/2011	da 10/12/2011 a 30/01/2012				
Riporto:		€ 25.822,59	€ 9.505,99				
e24 - RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO di albero e...essario sino a dare un lavoro finito.							
	€ 354,46		€ 354,46				
e25 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINO PORTARIFIUTI CON POSA CENERE	€ 583,95		€ 583,95				
f01 - CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, Rck10 N/mm ²	€ 334,00		€ 334,00				
f03 - Calcestruzzo a durabilita' garantita CLASSE DI CONSISTENZA S4, RESISTENZA CARATTERISTICA RCK25	€ 719,59		€ 719,59				
f06 - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C..., con impiego di barre fino al Ø 12-14.	€ 408,66		€ 408,66				
f07 - CASSEFORME in legname o metalliche per...ie dei casseri a contatto con il getto.	€ 576,76		€ 576,76				
f09 - Realizzazione di muratura per muretti in pietrame a vista	€ 1.048,88		€ 1.048,88				
f14 - Fornitura e posa in opera di copertina di coronamento in lastra basaltica	€ 852,14		€ 852,14				
f50 - Realizzazione di siepi in essenze mediterranee (mirto, pitosforo, piracantha, e altre similari) h 60-80 cm in ragione di n° 4 piantine/m	€ 861,00		€ 861,00				
h10 - Fornitura e posa in opera di cavidotto... pozzetti, rinterro con sabbia s=30 cm.	€ 264,60		€ 264,60				
h13 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO UNIPOLARE TIPO FG7OR 0,6/1KV -SEZIONE 1X6 MMQ	€ 1.597,44		€ 1.597,44				
h21 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI DERIVAZIONE O DI LINEA	€ 68,98		€ 68,98				
f55 - Fornitura e stesa di terra vegetale pa...lla D.L., in opera per aiuole e simili.	€ 760,40		€ 760,40				
A Riportare:		€ 25.822,59	€ 17.936,85				

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 02/11/2011 a 09/12/2011	da 10/12/2011 a 30/01/2012				
Riporto:		€ 25.822,59	€ 17.936,85				
h18 - Fornitura e posa in opera di pozzetto ...ento cavidotti in PE flessibile Ø80/50.	€ 571,32		€ 571,32				
h28 - Fornitura e posa in opera di pozzetto ...ollegamento cavidotti in PE flessibile.	€ 463,30		€ 463,30				
h29 - Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione	€ 2.949,54		€ 2.949,54				
h30 - Fornitura e posa in opera di lanterna per montaggio portato su palo	€ 3.403,68		€ 3.403,68				
sic - Oneri per la sicurezza	€ 1.102,72	€ 465,59	€ 637,13				
IMPORTO		€ 26.288,18	€ 25.961,82				
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 26.288,18	€ 52.250,00				
%		50,31%	49,69%				
% PROGRESSIVA		50,31%	100,00%				

Comune di Norbello
Provincia di Oristano

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA
 PUBBLICA LUNGO VIA AZUNI

COMMITTENTE:

PROGRAMMAZIONE S.A.L.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta Oneri della sicurezza Somme a disposizione dell'amministrazione Costo complessivo dell'opera	

Norbello, li

Il Progettista:

PROGRAMMA S.A.L.						
DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
02/11/2011	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Inizio lavori
09/12/2011	38	38	€ 26.288,14	€ 26.288,14	50,31	Si
30/01/2012	90	52	€ 52.250,00	€ 25.961,86	100,00	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Comune di Norbello
Provincia di Oristano

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA
 PUBBLICA LUNGO VIA AZUNI


COMMITTENTE:

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	
Oneri della sicurezza	
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Costo complessivo dell'opera	

Norbello, li

Il Progettista:

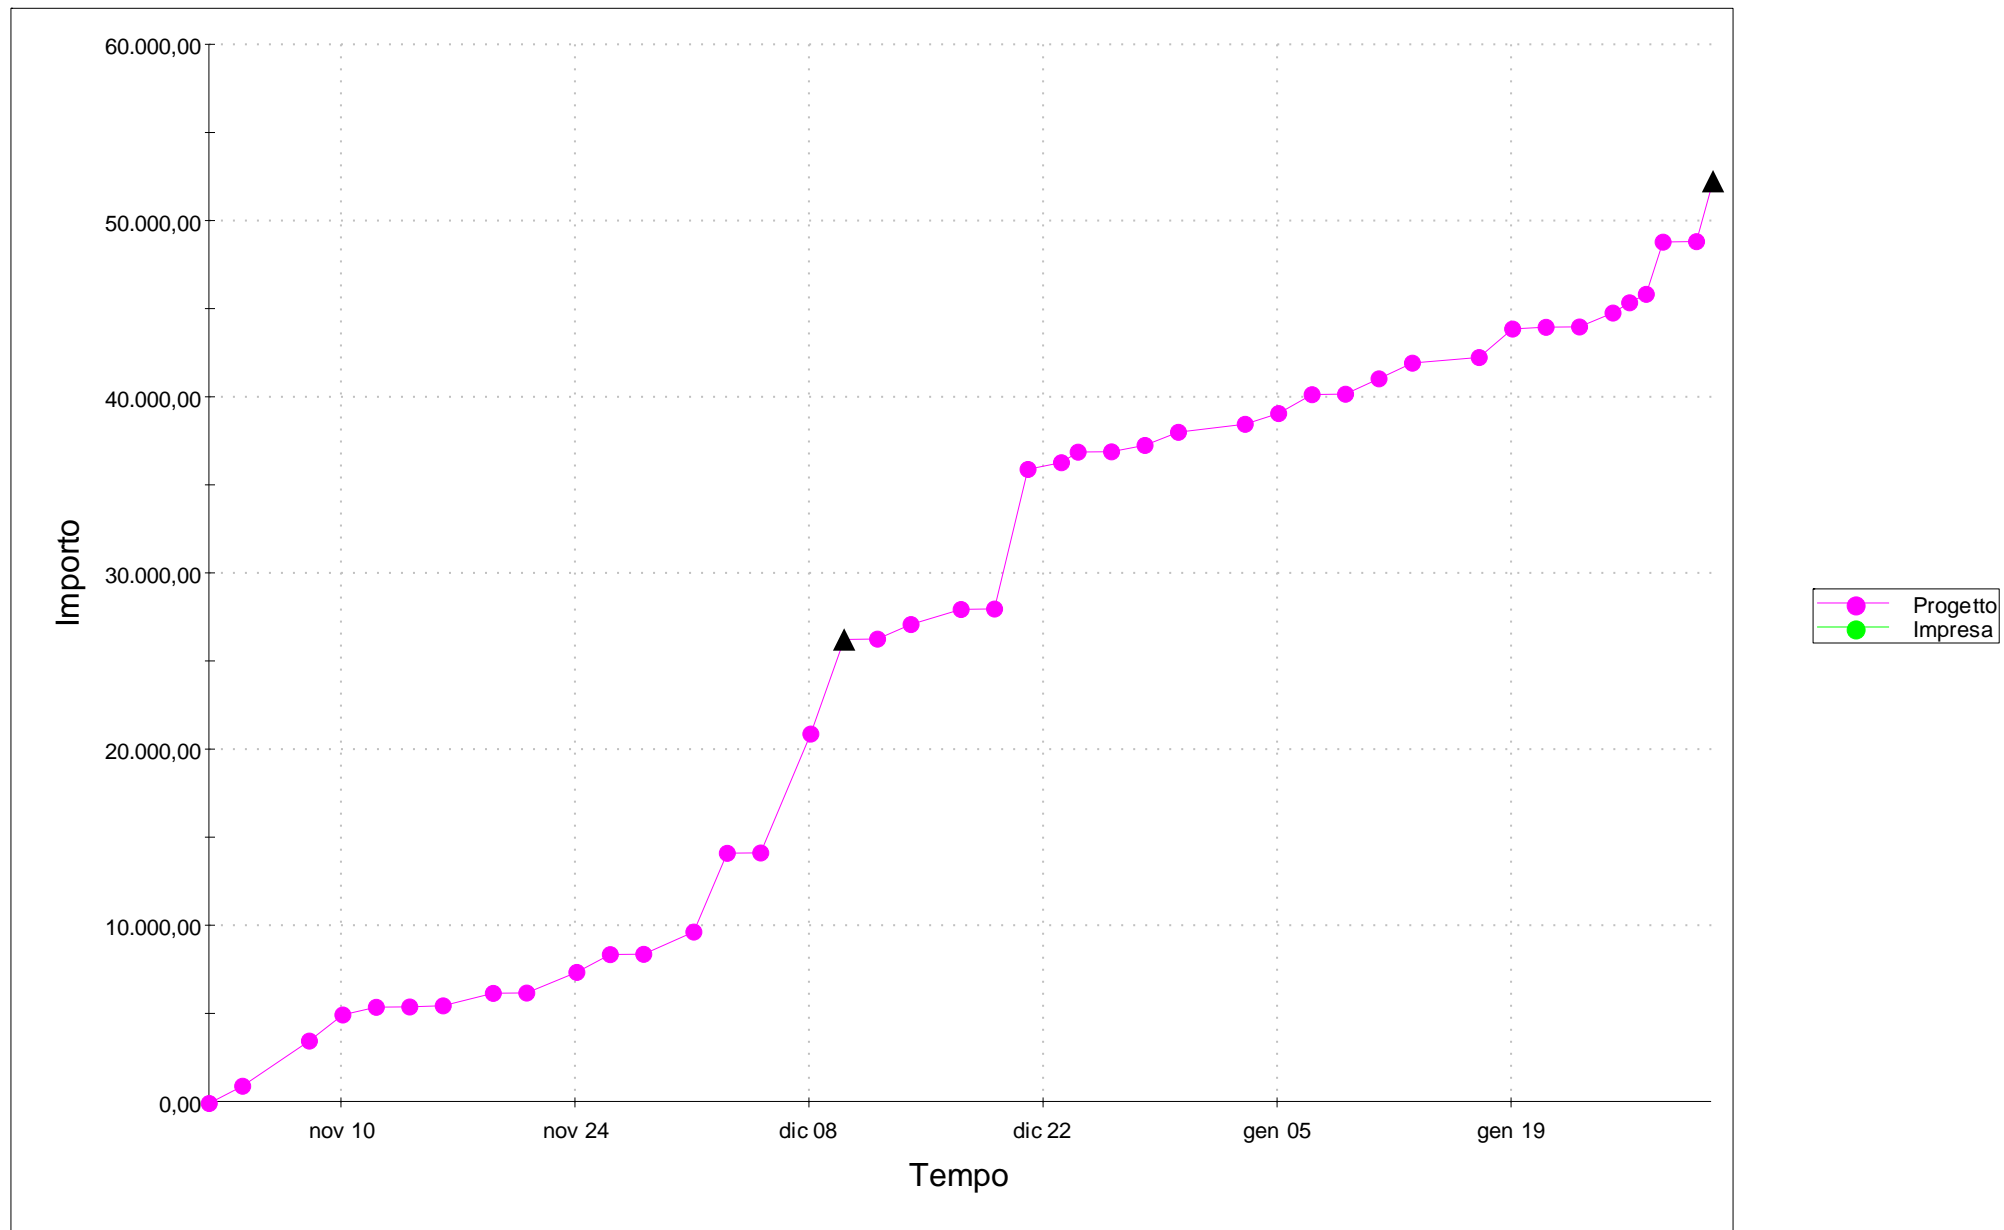

LEGENDA: ● punto che delimita periodi a media di produzione costante
 ▲ Stato Avanzamento Lavori programmato
